Id		Opgavetil	Opgavenavn	Varighed	Startdato	Slutdato
1						
2						
3			Etablering af byggeplads	5 dage	ma 18-08-25	fr 22-08-25
4			Opsætning af stillads Ballumgade	10 dage	ma 18-08-25	fr 29-08-25
5			Opsætning af stillads Hedebygade	12 dage	ma 29-09-25	ti 14-10-25
6			Montering af prøvevindue	2 dage	to 28-08-25	fr 29-08-25
7			Udskiftning af vinduer Ballumgade 76 stk, Hejsning af vinduer til etape 2	19 dage	on 24-09-25	ma 20-10-25
8			Udskiftning af vinduer Hedebygade 69 stk	14 dage	ti 21-10-25	fr 07-11-25
9			Renovering af opgangsvinduer	5 dage	ma 15-09-25	fr 19-09-25
10			Malerbehandling af opgangsvinduer, port samt hoved-, bag- og kælderdøre	20 dage	ma 29-09-25	fr 24-10-25
11						
12			**Blikkenslager**			
13			Afdækning af tagarbejder (Blikkenslager)			
14			Ny zink på kvisttag	54 dage	ma 01-09-25	to 13-11-25
15			Ny zink på opgangstag, gade	54 dage	ma 01-09-25	to 13-11-25
16			Ny zink på opgangstag, gård	54 dage	ma 01-09-25	to 13-11-25
17			Ny zinkindækning ved tagaltan	54 dage	ma 01-09-25	to 13-11-25
18			Udskiftning af individuelle skifersten	54 dage	ma 01-09-25	to 13-11-25
19			Udskiftning af tagrender og nedløb	54 dage	ma 01-09-25	to 13-11-25
20						
21			**Facadearbejder murer**			
22			Udbedring af sætningsrevner, angivet i m revne (murer)	54 dage	ma 01-09-25	to 13-11-25
23			Pudsreparationer, glat facade	54 dage	ma 01-09-25	to 13-11-25
24			Pudsreparationer, refendfuget facade	54 dage	ma 01-09-25	to 13-11-25
25			Udbedring af revner i gesimser og støbte sålbænke (murer)	54 dage	ma 01-09-25	to 13-11-25
26			*Gesimser (antal revner)*	54 dage	ma 01-09-25	to 13-11-25
27			*Støbte sålbænke (antal revner)*	54 dage	ma 01-09-25	to 13-11-25
28			Udbedring af pudsskader på gesimser og støbte sålbænke (murer)	54 dage	ma 01-09-25	to 13-11-25
29			*Gesimser*	54 dage	ma 01-09-25	to 13-11-25
30			*Støbte sålbænke*	54 dage	ma 01-09-25	to 13-11-25
31			Overfladebehandling af gesimser og støbte sålbænke (murer)	54 dage	ma 01-09-25	to 13-11-25
32			*Gesimser*	54 dage	ma 01-09-25	to 13-11-25
33			*Støbte sålbænke*	54 dage	ma 01-09-25	to 13-11-25
34						
35			Afleveringsforretning	1 dag	fr 14-11-25	fr 14-11-25
36			Førgennemgang	1 dag	fr 14-11-25	fr 14-11-25
37			Mangeludbedring	14 dage	ma 17-11-25	to 04-12-25
38			Nedtagning af stilladser	14 dage	to 04-12-25	ti 23-12-25

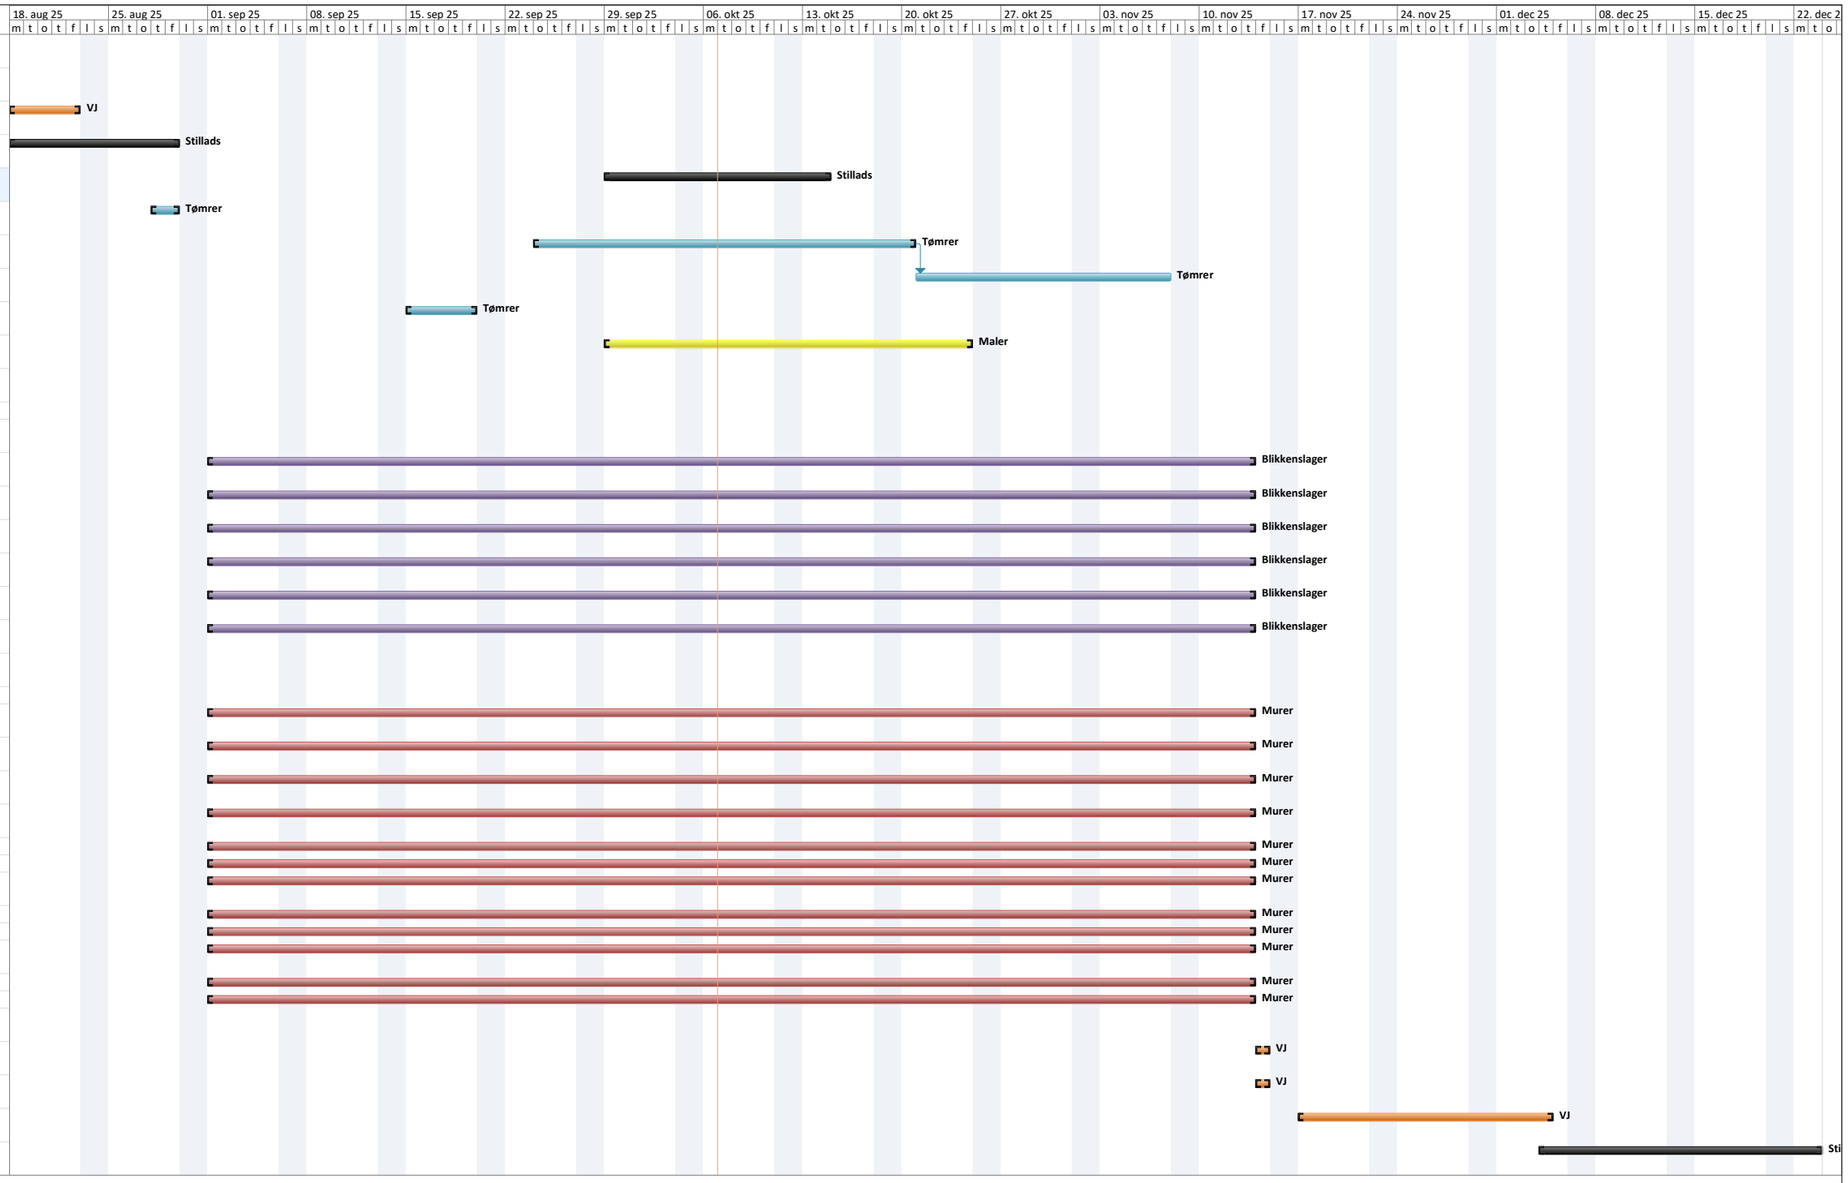

Projekt: Hedebygade tidsplan.mp
Dato: ti 07-10-25

Opgave		Milepæl		Projektoversigt		Ekstern milepæl		Inaktiv milepæl		Manuel opgave		Manuel oversigtsopløftning		kun start		Deadline	
Opdeling		Hovedopgave		Eksterne opgaver		Inaktiv opgave		Inaktiv oversigt		Kun varighed		Manuel oversigt		Kun slutdato		Fremdrift	
